



Top plast fjernes bemærk inden udpakning, Vinduer & døre er placeret nede i pakken



Brug vejledning til sortering og optælling af alle dele, Husk alle dele skal overdækkes, i tilfælde af regn eller ligende.

**HUSK at gemme vejledning ved henvendelse
SKAL PAKKE NR OPLYSES**



Ide til Fundament. (medfølger ikke) opsat på JUSTERBAR stolpesten til nedgravning, Grus i bunden virker som dræn, vi anbefaler montering af musegitter i bunden af ramme.



Tjæk underlag er i vatter



Monteres på trykimp. rem med dryp (Tilbehør) Rem skrues ned i fundament, husk murpap under rem.



Første lag væg bjælke skrues ned i fundament / rem. Husk at nedsænke / forbore inden montering af skruer



Første Bjælke skrues sammen i samling, Husk der altid skal bores for

Vigtig: Skru først hjørner sammen inden bjælker skrues sammen med fundament





Husk før og under opbygning at måle hytten X mål / vinkelrethed løbende under montering.

Efter hvert 5 Bjælke lag tjekkes at vægge er i Vatter



Husk Vinduer og døre må IKKE skrues fast i væg bjælkerne


Efter montering af vindue & Døre tjekkes at alt er i Vatter



Som tilbehør kan du tilkøbe Gulvpakker der indeholder 45x45 mm tryk imp. gulvstrøer , 18 eller 26 mm gulvbrædder med ende not



Til alle modeller hvor der indgår stolper, så kan disse afkortes / tilpasses i højden, da de leveres + 25 cm i længde, samt justerbar beslag skal monteres. (for yderlig info se monterings vejledning)

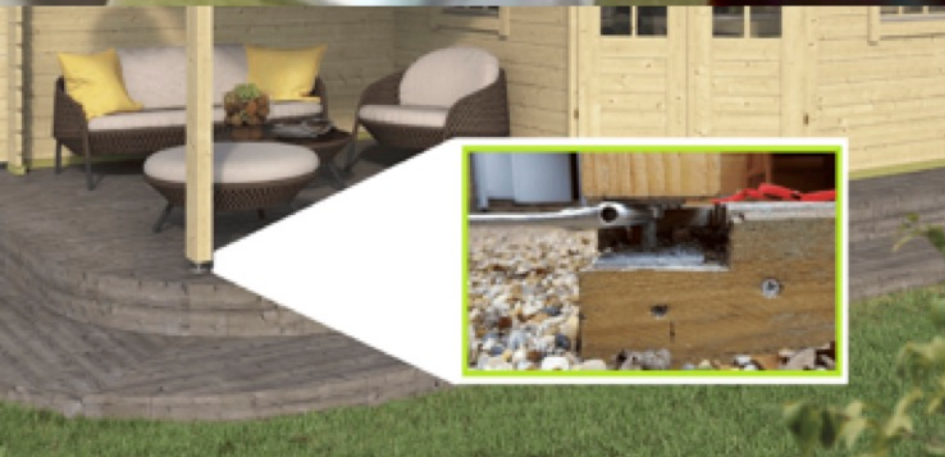


Højde justeres nemt ved at skrue møtrik op eller ned, Justering kan være nødvendig løbende i løbet af året pga. ændring af fugt.



Har du valgt en hytte med fladt tag anbefaler vi montering af afløbs membran (tilbehør) Start med at bore nedefra, til selve boret kommer igennem på overside, forsæt da med at bore fra overside.



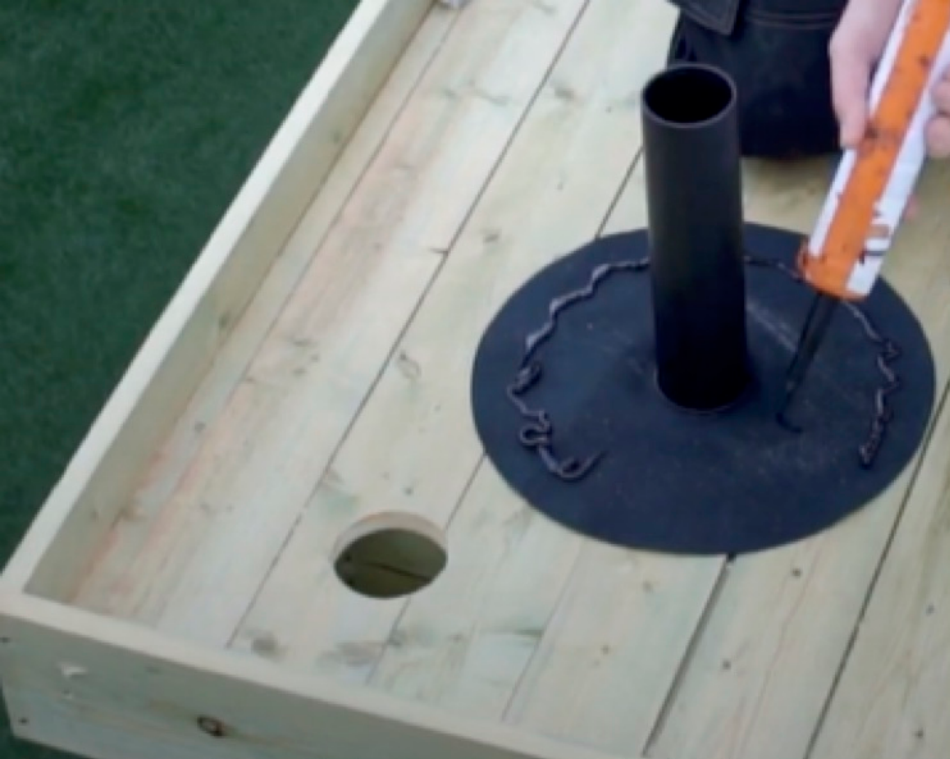


Hvis du ønsker at isolere dine ydervæge, kan du tilkøbe vor Væg/ Gulv pakke, som indeholder brædder og væg/gulv strøer i 45x45 mm, Vigtig er du ikke skruer noget fast direkte i ydervægen, men benytter beslag som dette eller ligende med en fals så brædder kan arbejde op og ned uden at være fikseret





Fejl der opstår ved fejlmontering, her ses karm der er fikseret til væg bjælke,

udbederes ved afmontering af skrue, og pres bjælker sammen igen

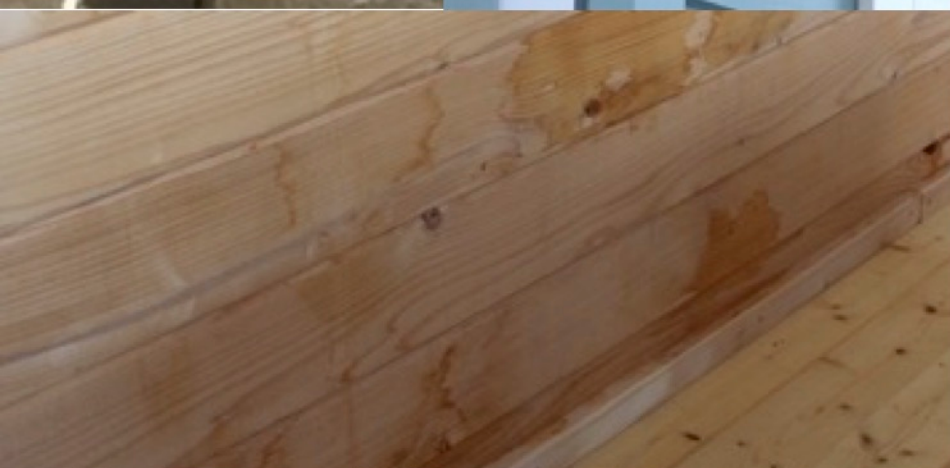

Fugt opstår ved manglende udluftning, monter derfor udluftning i hytten ved montering.

God overflade behandling anbefales



Foto af dør, misfarvning undgås bedst ved god overflade behandling, og udluftning

Tilbehør Udluftnings rist





Slagregn / vand indtrængning
kan næsten undgås ved god
overflade behandling udvendig &
indvendig



Misfarve / fugt indtrængning kan
forkomme efter 1 år eller 2,
Det opstår pga. mangelfuld overflade
behandling & udluftning



Undgå dine døre & karme går i
stykker pga. vind derfor anbefales
montering af hasper på hver dør

Montering af Stormbeslag
anbefales på alle hytter
(tilbehør)
